ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
1	**RIQUALIFICAZIONE PALAZZO DEL GHIACCIO**	230 g	ven 01/12/17	mer 01/08/18	
2	Consegna dei lavori	0 g	ven 01/12/17	ven 01/12/17	
3	**FASE 1 - AREE ESTERNE LATO OVEST**	60 g	ven 01/12/17	ven 02/02/18	
4	**Appresta menti di cantiere**	10 g	ven 01/12/17	lun 11/12/17	
5	Installazione cantiere	10 g	ven 01/12/17	lun 11/12/17	
6	Installazione cantiere fascia asservimento	5 g	mer 06/12/17	lun 11/12/17	5FF
7	**Categoria OG1 - edifici civili e industriali**	45 g	lun 11/12/17	sab 27/01/18	
8	**Impianto di raccolta acque bianche (cat. 5)**	45 g	lun 11/12/17	sab 27/01/18	
9	Smantellamento pavimentazioni esistenti	5 g	lun 11/12/17	sab 16/12/17	5
10	Esecuzione degli scavi	10 g	sab 16/12/17	mer 27/12/17	9
11	Posa della vasca di raccolta	5 g	ven 22/12/17	mer 27/12/17	10FI-5 g
12	Posa di pozzetto disoleatore	5 g	mer 27/12/17	lun 01/01/18	11
13	Posa dei nuovi collettori	15 g	mer 27/12/17	ven 12/01/18	10
14	Esecuzione di reinterri	10 g	sab 06/01/18	mer 17/01/18	13FI-5 g
15	Realizzazione nuove pavimentazioni	10 g	mer 17/01/18	sab 27/01/18	14
16	Sistemazione aree a verde	10 g	mer 17/01/18	sab 27/01/18	15I
17	Posa di pozzetti di ispezione e griglie	5 g	mar 23/01/18	sab 27/01/18	15FF
18	Taglio della vegetazione area asservita	3 g	sab 16/12/17	mer 20/12/17	10I
19	Esecuzione degli scavi area asservita	5 g	mer 20/12/17	lun 25/12/17	18
20	Posa collettore generale smaltimento nel Pellice	10 g	mer 27/12/17	sab 06/01/18	13II
21	Posa di pozzetti di ispezione collettore principale	5 g	sab 06/01/18	ven 12/01/18	20
22	Ripristino della vegetazione area asservita	5 g	mar 09/01/18	dom 14/01/18	21II+2 g
23	Realizzazione opere di mitigazione greto del fiume	20 g	lun 01/01/18	lun 22/01/18	20II+5 g
24	**Categoria OS28 - impianti termici e di condizionamento**	5 g	mer 27/12/17	lun 01/01/18	
25	**Impianto di raccolta acque bianche (cat. 5)**	5 g	mer 27/12/17	lun 01/01/18	
26	Installazione di pompa sommergibile	5 g	mer 27/12/17	lun 01/01/18	10
27	**Categoria OG1 - edifici civili e industriali**	32 g	lun 11/12/17	dom 14/01/18	
28	**Ripristino delle pavimentazioni (cat. 6)**	32 g	lun 11/12/17	dom 14/01/18	
29	Smantellamento pavimentazione in gomma lato ovest	3 g	lun 11/12/17	gio 14/12/17	9II
30	Posa membrana impermeabilizzante	3 g	gio 14/12/17	lun 18/12/17	29
31	Realizzazione nuova pavimentazione in gomma lato ovest	10 g	lun 18/12/17	gio 28/12/17	30
32	Smantellamento pavimentazione in gomma lato est	3 g	gio 28/12/17	dom 31/12/17	31
33	Posa membrana impermeabilizzante	3 g	dom 31/12/17	mer 03/01/18	32
34	Realizzazione nuova pavimentazione in gomma lato est	10 g	mer 03/01/18	dom 14/01/18	33
35	**Categoria OS30 - impianti elettrici**	50 g	lun 11/12/17	ven 02/02/18	
36	**Impianto di cogenerazione (cat. 2)**	50 g	lun 11/12/17	ven 02/02/18	
37	Approvvigionamento e posa cogeneratore	20 g	lun 11/12/17	lun 01/01/18	5
38	**Appresta menti di cantiere**	5 g	dom 28/01/18	ven 02/02/18	
39	Ridefinizione area di cantiere in funzione della FASE 2	5 g	dom 28/01/18	ven 02/02/18	17
40	**FASE 2 - AREE ESTERNE LATO EST**	40 g	ven 02/02/18	ven 16/03/18	
41	**Categoria OG1 - edifici civili e industriali**	35 g	ven 02/02/18	dom 11/03/18	
42	**Impianto di raccolta acque bianche (cat. 5)**	35 g	ven 02/02/18	dom 11/03/18	
43	Smantellamento pavimentazioni esistenti	6 g	ven 02/02/18	gio 08/02/18	39
44	Esecuzione degli scavi	8 g	gio 08/02/18	sab 17/02/18	43
45	Posa dei nuovi collettori	8 g	sab 17/02/18	dom 25/02/18	44
46	Esecuzione di reinterri	8 g	mar 20/02/18	mer 28/02/18	45FI-5 g
47	Realizzazione nuove pavimentazioni	10 g	mer 28/02/18	dom 11/03/18	46
48	Sistemazione aree a verde	10 g	mer 28/02/18	dom 11/03/18	47II
49	Posa di pozzetti di ispezione e griglie	5 g	mar 06/03/18	dom 11/03/18	47FF
50	**Categoria OS30 - impianti elettrici**	5 g	sab 17/02/18	gio 22/02/18	
51	**Impianto di raccolta acque bianche (cat. 5)**	5 g	sab 17/02/18	gio 22/02/18	
52	Alimentazione pompe sommerse	5 g	sab 17/02/18	gio 22/02/18	44
53	**Appresta menti di cantiere**	5 g	dom 11/03/18	ven 16/03/18	
54	Ridefinizione area di cantiere in funzione della FASE 3	5 g	dom 11/03/18	ven 16/03/18	49
55	**FASE 3a - OPERE IN COPERTURA**	125 g	ven 16/03/18	gio 26/07/18	
56	**Appresta menti di cantiere**	5 g	ven 16/03/18	mer 21/03/18	
57	Installazione cantiere	5 g	ven 16/03/18	mer 21/03/18	54
58	**Categoria OG1 - edifici civili e industriali**	75 g	mar 17/04/18	gio 05/07/18	
59	**Realizzazione nuovo impianto fotovoltaico (cat. 1)**	75 g	mar 17/04/18	gio 05/07/18	
60	Interventi in corrispondenza dei pilastri esistenti	15 g	mar 17/04/18	gio 03/05/18	73
61	Esecuzione di ancoraggi con tasselli chimici	5 g	gio 03/05/18	mar 08/05/18	60
62	Realizzazione nuova struttura metallica	20 g	gio 14/06/18	gio 05/07/18	83
63	**Categoria OS30 - impianti elettrici**	20 g	gio 05/07/18	gio 26/07/18	
64	**Realizzazione nuovo impianto fotovoltaico (cat. 1)**	20 g	gio 05/07/18	gio 26/07/18	
65	Installazione di pannelli fotovoltaici	15 g	gio 05/07/18	sab 21/07/18	62
66	Installazione di inverter e quadri di stringa	5 g	sab 21/07/18	gio 26/07/18	67I
67	Posa di cavi solari, tubi e canaline	5 g	sab 21/07/18	gio 26/07/18	65
68	Modifica quadri generali BT/MT	5 g	sab 21/07/18	gio 26/07/18	67FF
69	**Categoria OG1 - edifici civili e industriali**	50 g	ven 06/04/18	mar 29/05/18	
70	**Rifacimento guaine (cat. 3)**	50 g	ven 06/04/18	mar 29/05/18	
71	Rimozione guaine esistenti	5 g	ven 06/04/18	gio 12/04/18	81
72	Rimozione scossaline esistenti	5 g	ven 06/04/18	gio 12/04/18	71I
73	Revisione dei massetti delle pendenze	5 g	gio 12/04/18	mar 17/04/18	71
74	Realizzazione di primer bituminoso	5 g	mar 08/05/18	dom 13/05/18	61
75	Realizzazione nuova membrana impermeabilizzante	10 g	lun 14/05/18	gio 24/05/18	74II+5 g
76	Trattamento idrorepellente delle quinte di protezione	5 g	sab 19/05/18	gio 24/05/18	75FF
77	Posa scossaline perimetrali	5 g	gio 24/05/18	mar 29/05/18	76
78	**Categoria OS28 - impianti termici e di condizionamento**	85 g	ven 16/03/18	gio 14/06/18	
79	**Rifacimento guaine (cat. 3)**	85 g	ven 16/03/18	gio 14/06/18	
80	Smontaggio e spostamento UTA e canalizzazioni	15 g	ven 16/03/18	dom 01/04/18	54
81	Rimozione tubazioni esistenti	10 g	mar 27/03/18	ven 06/04/18	80II+10 g
82	Posa nuove tubazioni	15 g	mar 29/05/18	gio 14/06/18	77
83	Trasferimento e rimontaggio UTA e canalizzazioni	15 g	mar 29/05/18	gio 14/06/18	82II
84	**FASE 3b - FINITURE INTERNE**	130 g	ven 16/03/18	mer 01/08/18	
85	**Categoria OG1 - edifici civili e industriali**	5 g	mar 17/04/18	dom 22/04/18	
86	**Impianto smaltimento neve (cat. 4)**	5 g	mar 17/04/18	dom 22/04/18	
87	Esecuzione getto in calcestruzzo	5 g	mar 17/04/18	dom 22/04/18	93
88	Posa rete elettrosaldata	5 g	mar 17/04/18	dom 22/04/18	87II
89	**Categoria OS28 - impianti termici e di condizionamento**	15 g	dom 01/04/18	mar 17/04/18	
90	**Impianto smaltimento neve (cat. 4)**	15 g	dom 01/04/18	mar 17/04/18	80II
91	Posa nuove tubazioni	10 g	dom 01/04/18	gio 12/04/18	80
92	Installazione elettropompe	5 g	gio 12/04/18	mar 17/04/18	93II
93	Realizzazione di circuito di riscaldamento	5 g	gio 12/04/18	mar 17/04/18	91
94	**Categoria OG1 - edifici civili e industriali**	75 g	ven 16/03/18	lun 04/06/18	
95	**Ripristino delle finiture edili (cat. 7)**	75 g	ven 16/03/18	lun 04/06/18	
96	Spicconatura intonaco	15 g	ven 16/03/18	dom 01/04/18	54
97	Risanamento murature tramite rinzaffo	20 g	mar 27/03/18	mar 17/04/18	96II+10 g
98	Realizzazione dell'intonaco	20 g	gio 12/04/18	gio 03/05/18	97FI-5 g
99	Realizzazione delle tinteggiature	40 g	dom 22/04/18	lun 04/06/18	98II+10 g
100	Demolizione controsoffitti scala D	5 g	gio 24/05/18	mar 29/05/18	75
101	Realizzazione nuovi controsoffitti scala D	3 g	mar 29/05/18	ven 01/06/18	100
102	Demolizione controsoffitti area ristoro (piano 2°)	3 g	gio 24/05/18	dom 27/05/18	100II
103	Realizzazione nuovi controsoffitti area ristoro (piano 2°)	5 g	dom 27/05/18	ven 01/06/18	102
104	**Categoria OG1 - edifici civili e industriali**	**10 g**	**ven 16/03/18**	**mar 27/03/18**	
105	**Impianto di cogenerazione**	**10 g**	**ven 16/03/18**	**mar 27/03/18**	
106	Realizzazione tagli su solai per nuovo cavedio	5 g	ven 16/03/18	mer 21/03/18	54
107	Realizzazione nuovo cavedio cogeneratore-centrale termica	10 g	ven 16/03/18	mar 27/03/18	106II
108	**Categoria OS28 - impianti termici e di condizionamento**	35 g	ven 16/03/18	dom 22/04/18	
109	**Impianto di cogenerazione (cat. 2)**	35 g	ven 16/03/18	dom 22/04/18	
110	Realizzazione collegamenti con le centrali	30 g	gio 22/03/18	dom 22/04/18	54FI+5 g
111	Installazione elettropompe	10 g	ven 16/03/18	mar 27/03/18	54
112	Revisione collegamenti e termoregolazione C.T.	10 g	mar 27/03/18	ven 06/04/18	111
113	**Categoria OS30 - impianti elettrici**	5 g	gio 22/03/18	mar 27/03/18	
114	**Impianto di cogenerazione (cat. 2)**	5 g	gio 22/03/18	mar 27/03/18	
115	Modifica quadro generale BT esistente	5 g	gio 22/03/18	mar 27/03/18	110II
116	**Appresta menti di cantiere**	5 g	gio 26/07/18	mer 01/08/18	
117	Rimozione cantiere	5 g	gio 26/07/18	mer 01/08/18	68
118	Fine lavori	0 g	mer 01/08/18	mer 01/08/18	117

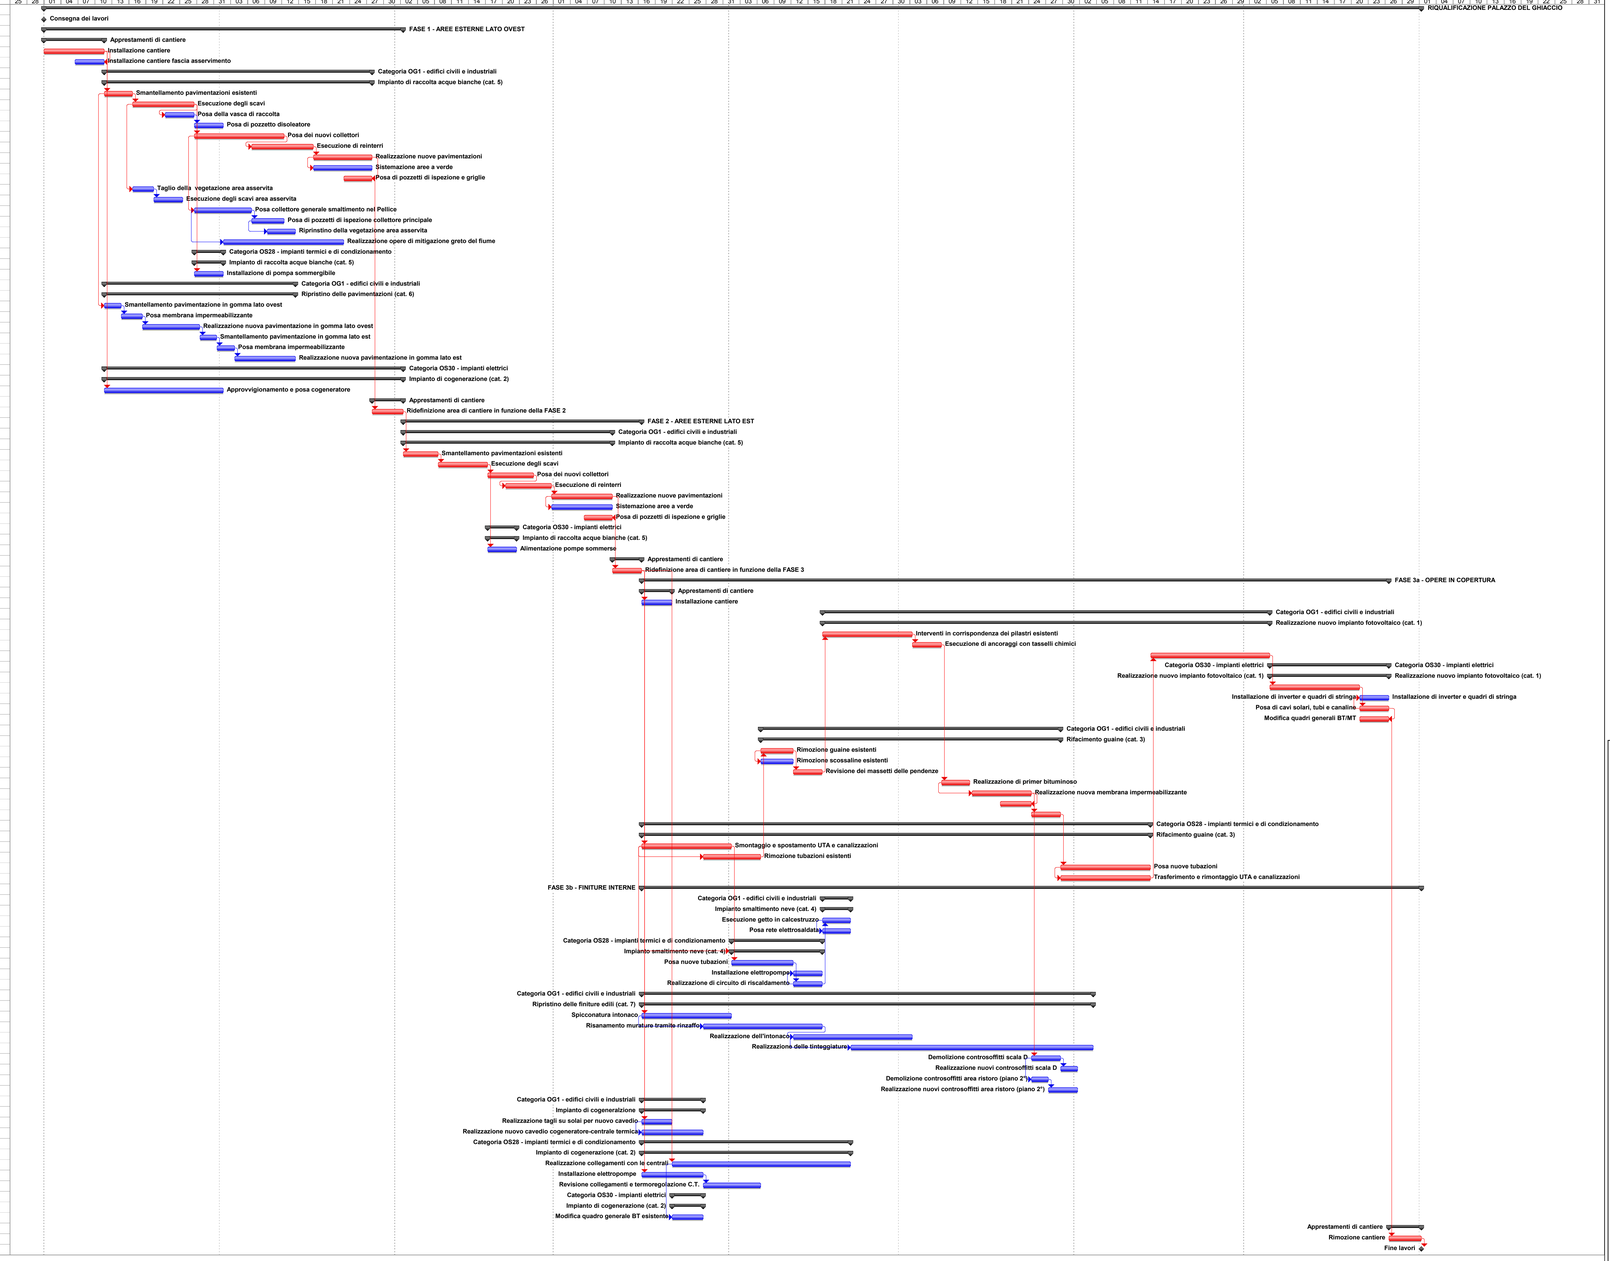

Progetto: K.WW.D.001_cronoprogr
Data: gio 04/05/17

Attività | Attività critica | Avanzamento | Cardine | Riepilogo | Attività riportata | Attività critica riportata | Cardine riportato | Avanzamento riportato | Divisione | Attività esterne | Riepilogo progetto | Riepilogo raggruppamento | Scadenza

STAZIONE APPALTANTE
S.C.R. Piemonte S.p.A.-Società di Committenza Regione Piemonte
corso Marconi n. 10 - 10125 Torino
www.scr.piemonte.it

OGGETTO - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PREVISTI ALL'INTERNO DEL PALAZZO DEL GHIACCIO DI TORRE PELLICE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Mythos Consorzio Stabile S.c.a.r.l.
Sede legale: Via Trottechien, 61 - 11100 Aosta
Sedi operative:
Via Giolitti 24 - 10123 Torino
Via Lampedusa 13 - 20141 Milano
Passage du Verger 5 - 11100 Aosta
Piazza Italia 34 - 07100 Sassari

Claudio Lucchin & Architetti Associati
Via Galvani, 6c - 39100 Bolzano

Coordinatore delle prestazioni specialistiche:
Dott.Ing. Fabio Inzani

Attività di rilievo: arch. Daniela Varnier
Progettazione strutturale: arch. Elli Vallermosi
Progettazione impiantistica: ing. Stefano Carrata
Progettazione bioclimatica: ing. Stefano Bortone
Coordinamento della sicurezza in progettazione: ing. Roberto Taddia
Progettazione antincendio: dott. ing. Fabio Inzani



PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI DESCRITTIVI

CRONOPROGRAMMA

K.WW.E.001

data: **maggio 2017**

scala: **---**

00	maggio 2017	Emissione PROGETTO ESECUTIVO	VAT	Ing. Stefano Bortone	Ing. Fabio Inzani
Revisione	Data	Descrizione	Verifica	Approvazione	
